

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES NOTA INFORMATIVA

19/OCTUBRE/2023

**NÚMERO DE OBRA:** 2023-0045  
**NOMBRE DE OBRA:** "REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DEL.EPIGEMENIO GONZALEZ FLORES."  
**FECHA DE INICIO:** 30 DE JUNIO DEL 2023  
**FECHA DE TÉRMINO:** 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
**MONTO CONTRATADO:** \$ 41,172,728.13  
**CONTRATISTA:** AMBIENTE PAISAJISMO Y OJO DE AGUA S. DE R.L. DE C.V.  
**AVANCE FÍSICO:** 75%

**ALCANCES:** REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y ÁREA VERDE PARA EL ESPARCIMIENTO, LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.

### METAS

- ✓ ÁREAS DE GYM AL AIRE LIBRE
- ✓ JARDIN ZEN
- ✓ ÁREA DE JUEGOS INFANTILES
- ✓ AREA DE PICNIC
- ✓ AREAS VERDES
- ✓ PARQUE PARA PERROS
- ✓ EXPLANADAS DE USOS MULTIPLES
- ✓ PLAZA DE ARTE URBANO
- ✓ FOOD PARK Y MESAS
- ✓ JARDIN DE LLUVIA

### PROCESO:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION EN 5 FRENTE:

#### FRENTE 1 ARBOLEDAS

AVANCE: 87%

SE TRABAJA EN DESPALME DE AREAS VERDES, COLADO DE PLANCHA DE CONCRETO EN AREA DE GYMNASIO, HABILITADO DE CONCRETO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES, SE TRABAJA EN ZANJAS PARA DUCTOS ELÉCTRICOS

#### FRENTE 2 CONSTITUYENTES

AVANCE: 90%

SE TRABAJA EN HABILITADO DE PARQUE PARA PERROS Y CALISTENIA, MURO PARA ESCALAR, DESPALME AREAS VERDES Y LIMPIEZA

#### FRENTE 3 EL PARQUE/PEÑUELAS

AVANCE: 90%

SE TRABAJA DESPALME AREAS VERDES, COLADO DE PASOS PEATONALES Y LIMPIEZA

#### FRENTE 4 SAN PABLO

AVANCE: 90%

SE TRABAJA EN COLADO DE PASOS PETONALES, ACARREO DE TIERRA DE MONTICULO Y LIMPIEZA

#### FRENTE 5 CIPRESES

AVANCE: 50%

SE TRABAJA EN COLADO DE DENTELLONES, COLADO DE SENDEROS Y CICLOVÍA



**ADMINISTRATIVO:**


ESTIMACIÓN NO. 1	\$ 842,176.36	PAGADA		
ESTIMACIÓN NO. 2	\$ 1'020,875.05	PAGADA		
ESTIMACION NO. 3	\$ 1'590,288.93	PAGADA		
ESTIMACION NO. 4	\$ 2'655,391.00	PAGADA		
ESTIMACION NO. 5	\$ 8,247,919.43	PAGADA		
ESTIMACION NO. 6	\$ 6,432,614.20	<u>POR PAGAR</u>		
<b>EJERCIDO:</b>	<b>\$ 20,789,264.97</b>		<b>POR EJERCER:</b>	<b>\$ 20,383,463.16</b>

**FOTOS DEL ANTES:**



**FOTOS DE PROCESO:**

Frente 1 ARBOLEDAS

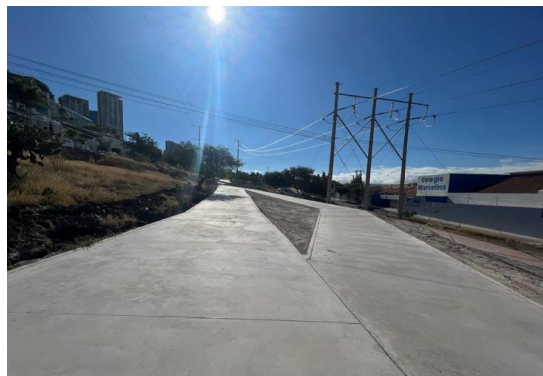

Frente 2 CONSTITUYENTES



Frente 3 EL PARQUE/PEÑUELAS



Frente 4 SAN PABLO



Frente 5 CIPRESES

