



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA INFORMATIVA

FECHA: 17 DE SEP

NÚMERO DE OBRA:	2021-0114
NOMBRE DE OBRA:	URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO EN SAN PEDRO MÁRTIR
FECHA DE INICIO:	27 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2021
MONTO:	\$ 13,825,111.53 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTOS ONCES PESOS 73/100 M.N
CONTRATISTA:	C. ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL
AVANCE FÍSICO:	55 % DE AVANCE FÍSICO.
ÁREA TOTAL DE URBANIZAION:	21,708 m2 APROX.

ALCANCES:

FRENTE 1 (1716ML)

- CONCRETO ASFALTICO EN ARROYO VEHICULAR;
- GUARNICIONES;
- BANQUETAS;
- SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL;
- ILUMINACIÓN DE VIALIDAD AÉREA
- REUBICACIÓN DE POSTES Y ARBOLES EXISTENTES,
- COMPENSACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS

FRENTE 2 (294ML)

- GUARNICIONES;
- BANQUETAS;
- EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN ARROYO VEHICULAR;
- SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL;
- ILUMINACIÓN DE VIALIDAD AÉREA
- REUBICACIÓN DE POSTES Y ARBOLES EXISTENTES,
- COMPENSACIÓN DE ESPECIES ARBORÉAS.

PROCESO:

SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- EXCAVACIONES A MÁQUINA DE MATERIAL TIPO "B", (90%)
- CARGA A MÁQUINA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES; (90%)
- SUBBASE CON TEPETATE DE BANCO EN ZONA DE ARROYO VEHICULAR (70%),
- GUARNICIONES DE CONCRETO (550ML) 12%
- BANQUETAS DE CONCRETO (500ML) 12%
- DEMOLICIÓN DE MURO DE PIEDRA BRAZA EXISTENTE
- TRABAJOS DE GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS.


FALTANTES:

FRENTE 1

- SUBBASE
- BASE
- CARPETA
- GUARNICIONES
- BANQUETAS
- SEÑALÉTICA
- CICLOVÍA
- ILUMINACIÓN

FRENTE 2

- EMPEDRADO
- BANQUETAS
- SEÑALÉTICA
- ILUMINACIÓN

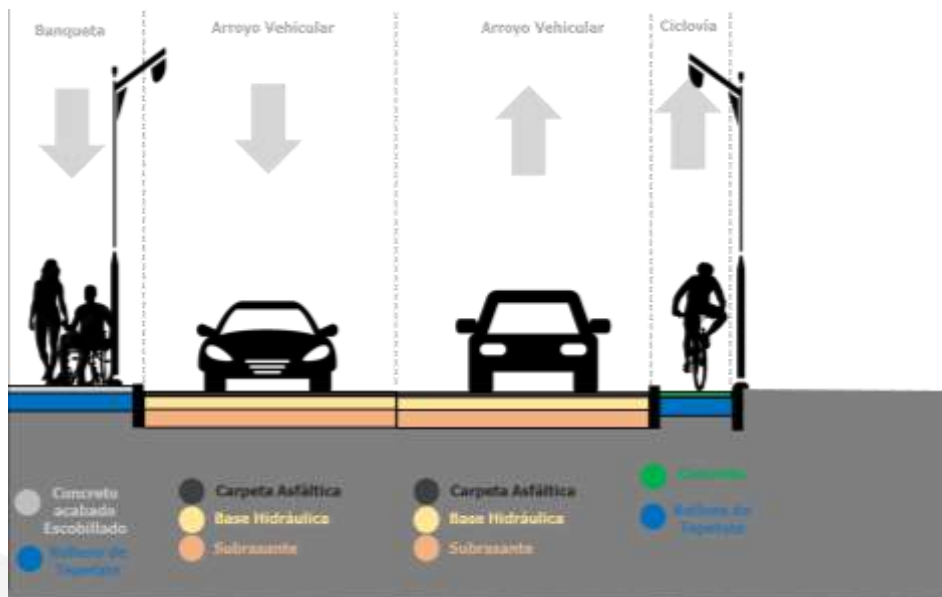

MAPEO (CROQUIS):

URBANIZACION
(2010 ML)

